

Centro de Apoio Operacional da Saúde – CaoSAÚDE

**RELATÓRIO PRELIMINAR DE VISITA TÉCNICA**

<b>Ministério Público do Estado do Tocantins</b>	Centro de Apoio Operacional da Saúde – CaoSAÚDE
<b>Local da Inspeção:</b>	Obra do CAPS Infantil - ACSU SO 130 (1301 S), APM 19, Avenida LO 31 / Avenida NS 01
<b>Município:</b>	Palmas
<b>Data da vistoria:</b>	05.09.2022
<b>Requisitante:</b>	Promotora de Justiça Araína Cesárea Ferreira dos Santos D'Alessandro – 27ª Promotoria de Justiça da Capital
<b>Solicitação:</b>	Edoc 07010505617202261
<b>Equipe Técnica MPE</b>	
<b>Coordenadora do CaoSAÚDE</b>	Araína Cesárea Ferreira dos Santos D'Alessandro
<b>Analista Ministerial/CaoSAÚDE</b>	Alice Macedo Cordeiro Borges
<b>Técnica Ministerial</b>	Roberta Barbosa da Silva
<b>Técnica Ministerial - Fotógrafa</b>	Francisca Coelho de Souza Soares
<b>ASCOM/MPE</b>	João Alberto Pedrini
<b>Psicóloga do CAOPIJ</b>	Gabriela Haeffner
<b>Engenheiros Civis do MPE</b>	Renato Antunes Magalhães e Gabriel Antônio Ribeiro Souza

Centro de Apoio Operacional da Saúde – CaoSAÚDE

**RELATÓRIO**

**Presentes na Inspeção:**

- Daniel Borini Zemuner - Secretário Executivo da Sec. Mun. de Saúde;
- Itano Arruda - Eng. Cível da SESAU e Fiscal do Contrato dessa obra;
- Guilherme Beirigo - Eng. Cível - Empresa HIKARI e Construtora;
- Laís Mith - Coordenadora de Saúde Mental do SUS;
- Jelda Sá - Coordenadora Atenção Especializada;
- Gean Carlo Quagliello - Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde;
- Antônio Grangeiro - Presidente do Conselho Municipal de Saúde;
- Alex Monteiro Freitas - Assessor Jurídico Saúde.

O Centro de Apoio Operacional da Saúde (CaoSAÚDE), atendendo à solicitação formulada pela Promotora de Justiça, Araína Cesárea Ferreira dos Santos D'Alessandro, da 27ª Promotoria de Justiça da Capital, por meio do edoc nº 07010505617202261, empreendeu visita técnica na obra de construção do Centro de Assistência Psicossocial Infantil (CAPSi) de Palmas, na data de 05/09/2022, às 09h30, com o objetivo de averiguar o andamento da obra e infraestrutura necessária para o funcionamento do serviço, bem como as pendências identificadas na última visita.


A obra fica localizada no endereço ACSU SO 130 (1301 S), APM 19, Avenida LO 31/Avenida NS 01 e está sendo realizada pela Construtora Hikari, a qual foi representada, na ocasião da visita, pelo engenheiro civil Guilherme Deirigo.

A visita foi acompanhada pela Promotora de Justiça e Coordenadora do CaoSAÚDE, Araína D'Alessandro e pelo Secretário Executivo da Secretaria Municipal de Saúde, Daniel Zemuner e sua equipe técnica, além de representantes do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude e Educação - CAOPIJE, os Engenheiros Cíveis do MPTO e o Presidente e representantes do Conselho Municipal de Saúde.

Foram colhidas as seguintes informações:

**Centro de Apoio Operacional da Saúde – CaoSAÚDE**

- O progresso da obra foi observado pelo erguimento da estrutura metálica que dará sustentação ao telhado que ficará sobre o prédio do CAPSi;

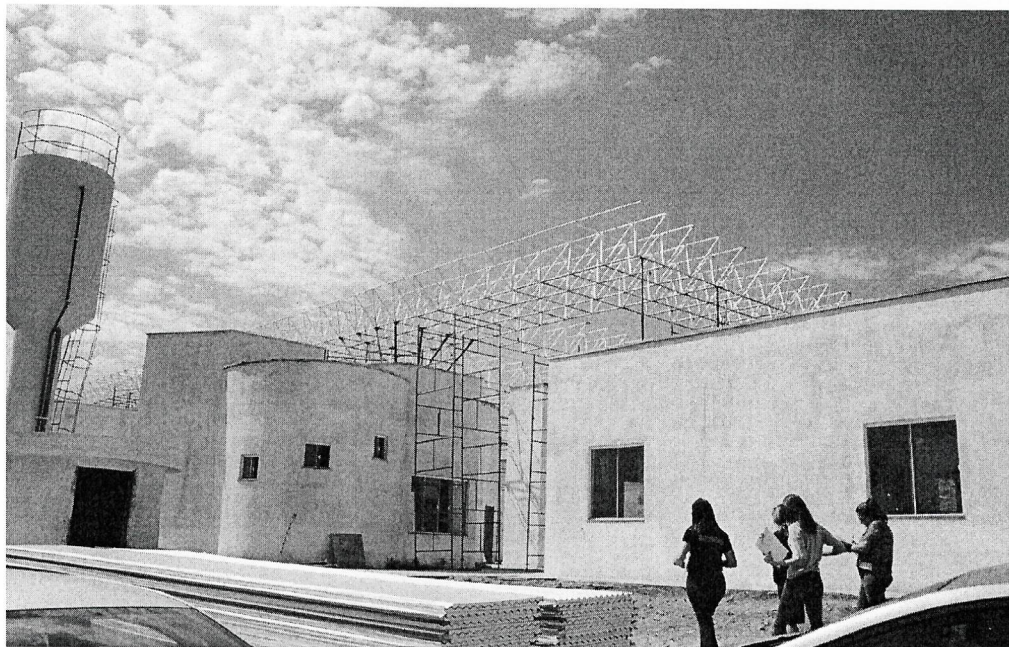


- Observou-se que as telhas que farão parte da cobertura do prédio, ou pelo menos parte delas, já estão na obra;




**Centro de Apoio Operacional da Saúde – CaoSAÚDE**

- No momento da inspeção, segundo informações do engenheiro da obra, 6 (seis) operários estavam trabalhando na instalação da estrutura metálica;

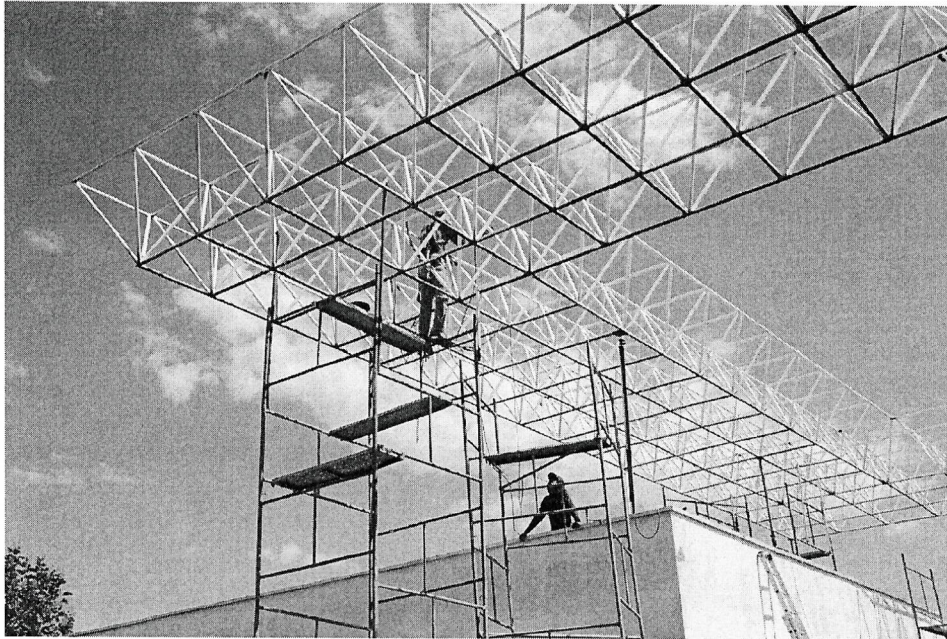

- Quando indagado, o engenheiro da obra, afirmou que o prazo previsto para a conclusão do telhado é de 12 (doze) dias;
- Notou-se que as obras para construção e instalação das fossas estão em andamento;

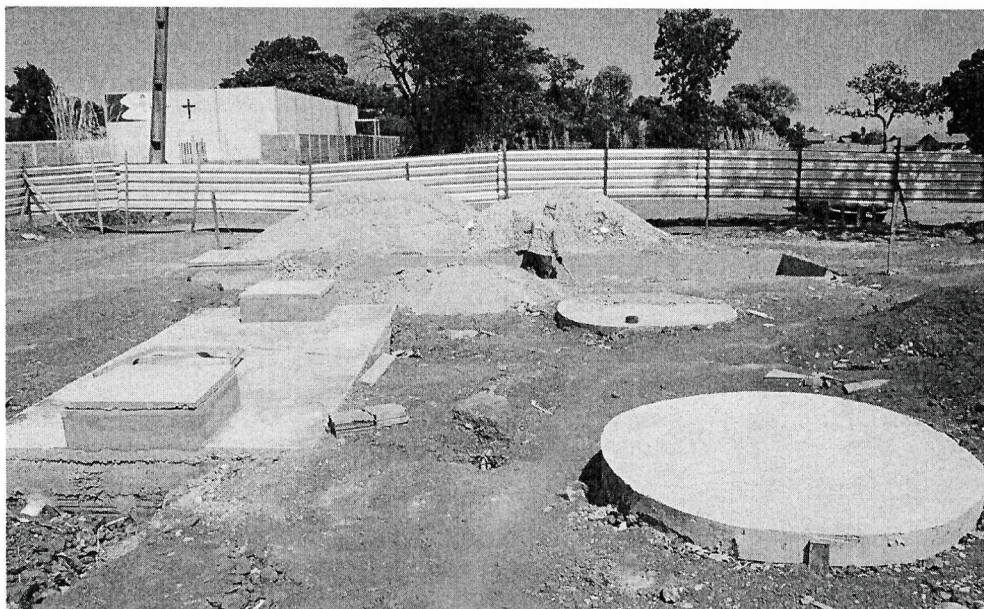

**Centro de Apoio Operacional da Saúde – CaoSAÚDE**


- No tocante as obras de infraestrutura do entorno e de acessibilidade ao redor da obra, continuam se alterações, ou seja, a rua interna atrás da obra do CAPSi ainda permanece sem abertura. Quando indagados sobre o porquê dessa demora no início desses trabalhos, informaram que a empresa está finalizando o asfalto da LO 31, para, só então, iniciar a abertura da rua interna;



*Rua interna a ser aberta*

**Centro de Apoio Operacional da Saúde – CaoSAÚDE**

- Observou-se que o asfaltamento da LO-31 que já estava em andamento na última inspeção, continua em progresso;

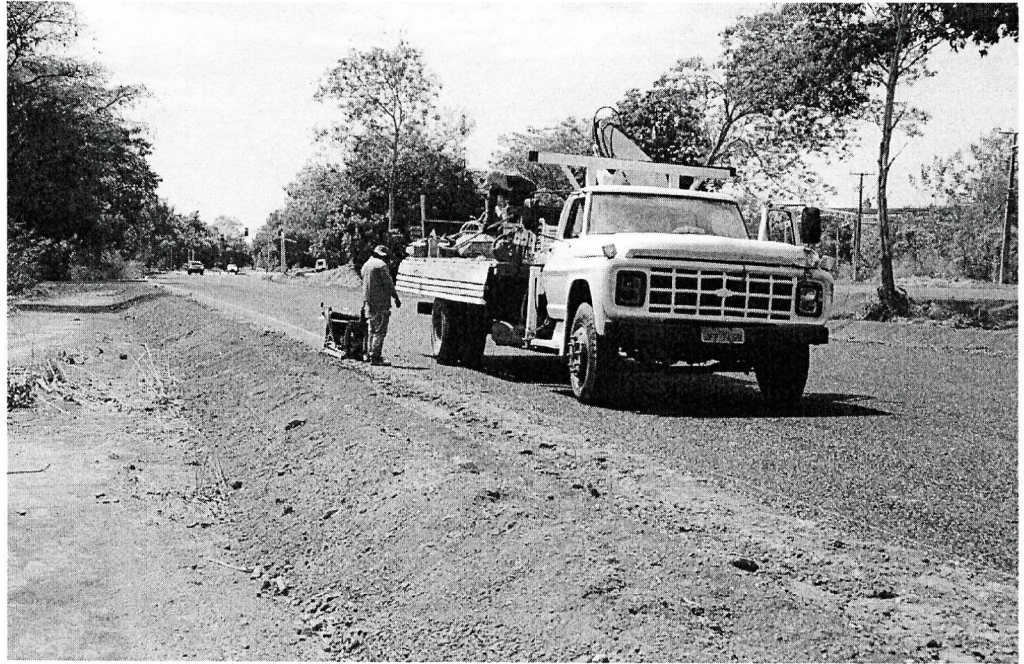

- Apesar dos atrasos, os representantes do município, bem como os responsáveis pela obra afirmam que o prazo de conclusão do empreendimento continua no mês de novembro de 2022;
- Os demais aspectos das obras do CAPSi e do entorno continuam inalterados.

É o relatório preliminar.

Palmas/TO, 12 de setembro de 2022.

  
**Alice Macedo Cordeiro Borges**  
*Analista Ministerial*  
Mat. 85308
